

チェックリスト

シューティングマシン搬入 現場確認 /ver.3



準備するもの

- メジャー
- スマホ (写真、動画撮影のため)
- 本チェックリスト、ペン

記入時情報

チェックリスト記入者

チェック日 (20xx / xx /xx)

搬入施設名

チェックしてください 写真/動画撮影

トラック

1 2トン車が、駐車スペースまで進入可能ですか？

※2トン車サイズ 全長6.0m, 幅1.9m, 高さ3.0m

Yes / No

2 2トン車の駐車+荷降ろし作業のスペースはありますか？

※駐車+荷降ろし作業スペース 全長13.1m、幅3m、高さ3.5m

Yes / No

3 駐車+荷降ろしスペースは、道交法違反になりませんか？

Yes / No

搬入経路

4 経路は、幅1.0m以上ありますか？

Yes / No

← 要 写真

5 経路は、高さ1.7m以上ありますか？


Yes / No

← 要 写真

6 経路に、曲がり角がありますか？

→ 曲がり角の、経路の幅は1.2m以上ありますか？

※経路の幅が1.2m以上ないと、シューティングマシンが旋回できず、搬入できません →



Yes / No

Yes / No

← 要 動画

7 設置場所までの経路でエレベータを使用しますか？

→ エレベータにシューティングマシンが入りますか？

※サイズ 幅62cm, 高さ150cm, 奥行115cm, 重量 112kg

Yes / No

Yes / No

8 設置場所までの経路で階段を使用しますか？

→ 使用する場合、合計で何段ありますか？

※階段がある場合は、6人以上で持ち上げる必要があります。

※別途料金となりますが、弊社スタッフを派遣することも可能です。

Yes / No

→ 段

7 経路に20cm以上の段差がありますか？

→ 20cm以上の段差は、全部で何カ所ありますか？

→ 最大の段差 (高さ) をメジャーで計測してください。

※段差が20cm以上ある場合は、6人以上で持ち上げる必要があります。

※別途料金となりますが、弊社スタッフを派遣することも可能です。

Yes / No

→ カ所

→ cm

← 要 写真

8 設置場所までの経路は舗装されていますか？



→ 舗装されてない場合は、経路状態に○をしてください。

※土、砂利、芝などの未舗装の場合、搬入できないことがあります。

Yes / No

土 砂利 芝 (人工芝含む) その他

2トン車+荷降ろし作業スペースサイズ

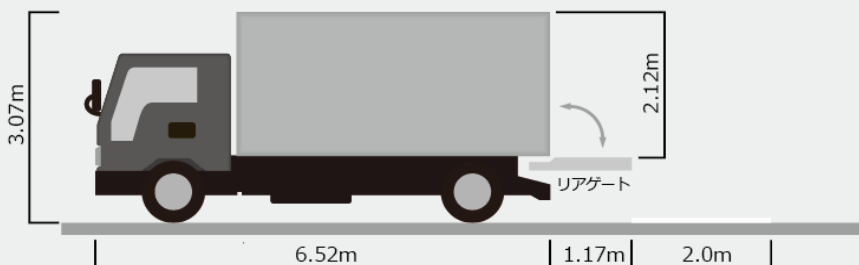

シューティングマシンサイズ（移動時）

